

Sprint Raio - X

Métodos Ágeis


Projeto: Carona UCB | **Responsável:** Pedro Augusto Ferreira | **Data:** 26 de set. de 2026

1 - Sobre a Sprint



O presente documento analisa o cenário crítico da Sprint do projeto Carona UCB, atualmente no seu sexto dia de execução de um total de dez. No momento a equipe enfrenta um grave colapso no fluxo de trabalho, onde apesar da projeção inicial de 40 Story Points, apenas 8 foram concluídos até o momento.

Assim, o andamento das atividades está seriamente comprometido pela não observação aos limites de trabalho em progresso (WIP), o que gerou um acúmulo insustentável de tarefas nas fases de desenvolvimento e teste, além de 3 impedimentos técnicos paralisantes e tentativas de mudança de escopo repentinas pelo Product Owner.

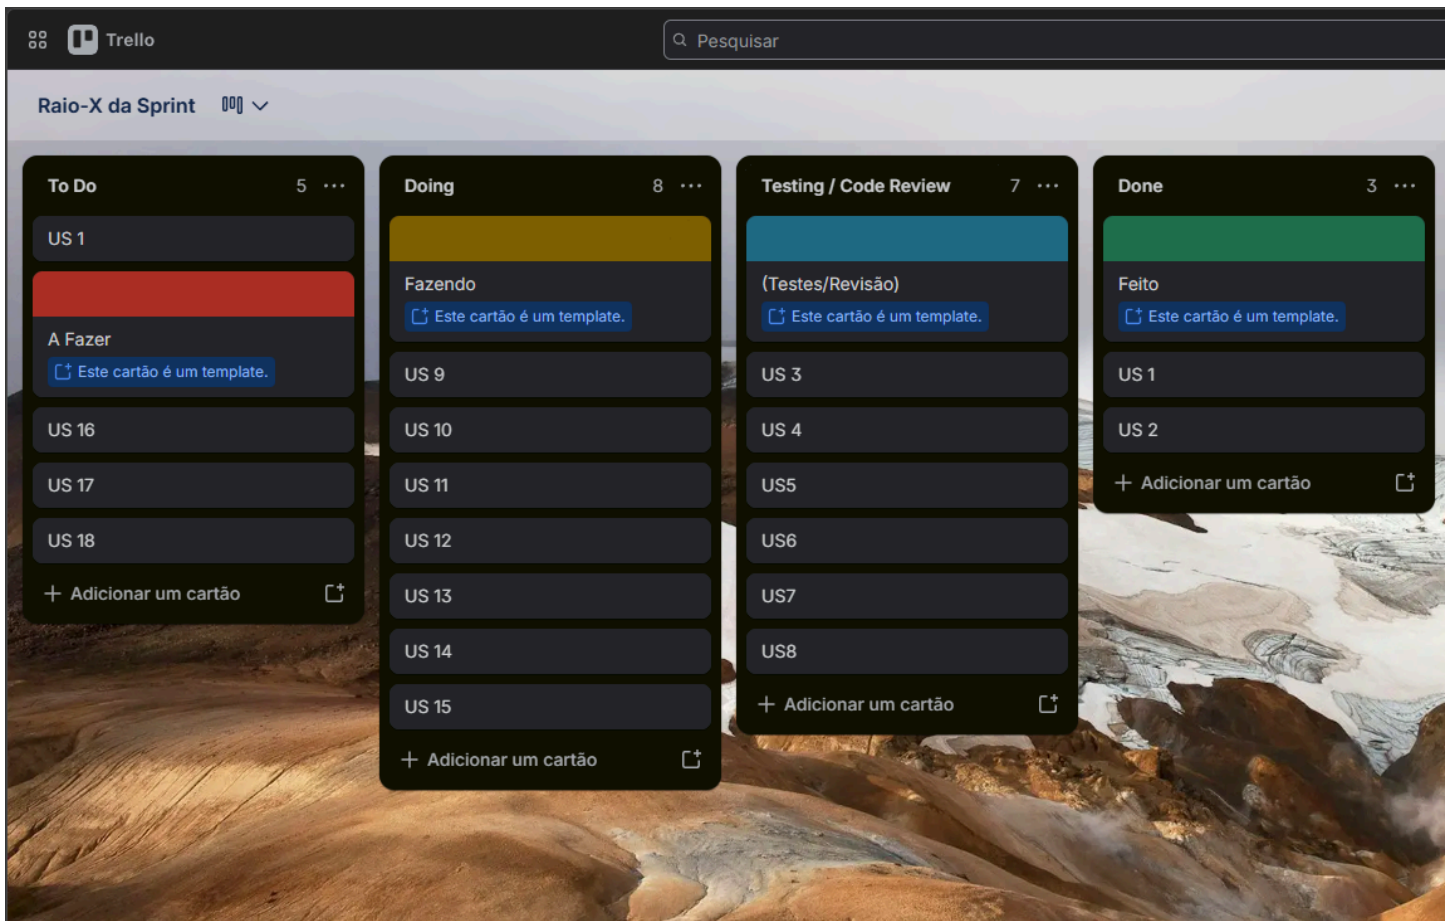

A seguir, apresenta-se o diagnóstico detalhado e o plano de ação para resgatar o fluxo de trabalho e salvar o Sprint Goal.

2 - Diagnóstico da Sprint



O cenário atual da Sprint evidencia que a equipe responsável pela criação do CaronaUCB perdeu o foco do *Sprint Goal* ao puxar para as colunas *Doing* e *Testing* diversas *User Stories* de menor relevância antes mesmo de validar outras Stories cruciais para o cumprimento do objetivo. Dentre os principais problemas da Sprint podemos destacar:

Fuga do Escopo e Distração: Mesmo a equipe já estando sobrecarregada com o volume de tarefas e com o curto prazo da Sprint, o PO ainda solicitou a adição de duas novas funcionalidades não essenciais ao app, sendo a integração com Spotify e a ajuda de custo com a gasolina via Pix. O pedido do PO no meio da Sprint que já estava apertada, desestabilizou ainda mais o time, sendo uma interrupção crítica que ameaçou ainda mais a capacidade técnica de finalizar a Sprint.


Ausência de Limites para o Trabalho em Progresso (WIP): A ausência de limites claros para o trabalho em progresso, fez com que o time desse andamento à 13 histórias simultaneamente, de modo em que em 6 dias de trabalho a equipe apenas entregou duas histórias.

Falha no Planejamento: A equipe assumiu um escopo de 40 *Story Points* para uma Sprint de apenas 10 dias, sendo um volume de *Story Points* irreal para ser concretizado em tão pouco tempo devido ao tamanho diminuto da equipe. A entrega de apenas 8 pontos até o 6º dia evidencia que o Sprint Planning foi mal executado e a capacidade produtiva da equipe foi gravemente superestimada.

3 - Kanban reorganizado com WIP e Dod




Para estancar o problema e resgatar a Sprint, o quadro e os cartões foram reorganizados a partir da aplicação de limites de trabalho em progresso (WIP) e da definição de alguns critérios para considerar um cartão como finalizado.

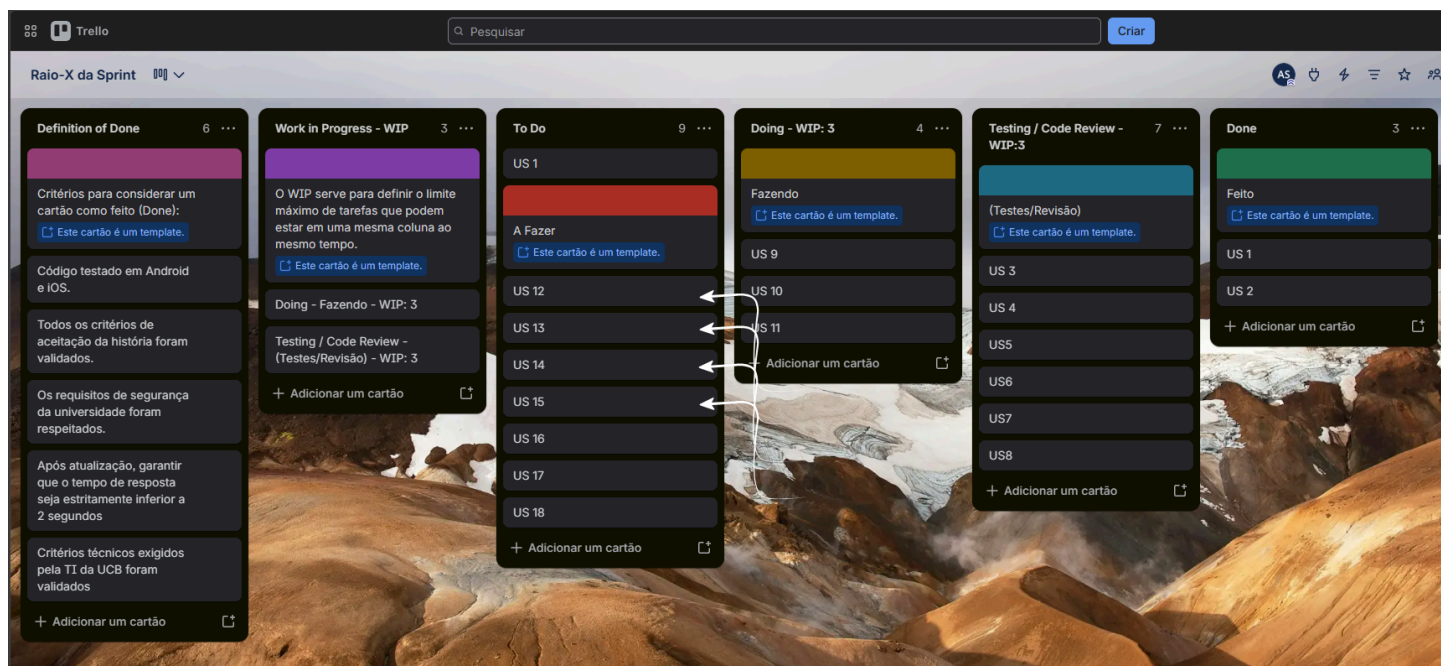

Criação das colunas Definition of Done e Work in Progress, assim como a devolução de 4 cartões que estavam na coluna Doing de volta para a coluna To do - Quadro no Trello

No primeiro passo, foram adicionados ao quadro as colunas Definition of Done e Work in Progress, para, respectivamente, definir os critérios de validação de um cartão e estabelecer os limites de trabalho. O limite de trabalho para as colunas Doing e Testing/Code Review foi definido para três tarefas, assim estas colunas somente podem apresentar três cartões simultaneamente.

Desse modo, para cumprir com o limite de WIP, as US 12, US 13, US 14 e US 15 que estavam anteriormente na coluna Doing foram movidas de volta para a coluna To do (conforme indicam as setas), deixando a coluna Doing com apenas três tarefas.

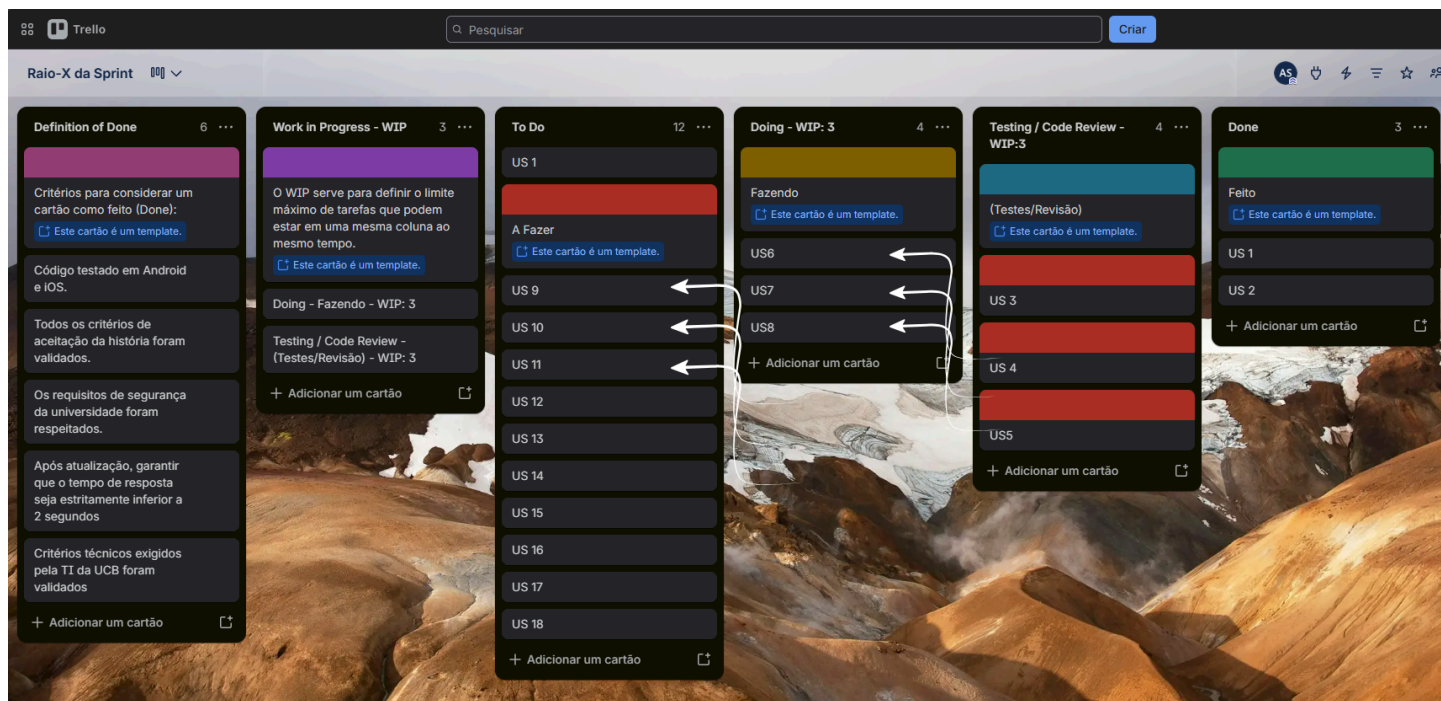

Reorganização total do quadro, fazendo com que o limite do WIP seja respeitado - Quadro no Trello

A coluna *Testing/Code Review* também estava sobrecarregada com 6 tarefas, portanto foi necessário mover a US 6, US 7 e US 8 de volta para a coluna *Doing*, deixando a coluna de Testes com apenas 3 tarefas satisfazendo a condição do WIP. Com a devolução de 3 tarefas para a coluna *Doing* esta passou a acumular 6 cartões, por isso foi necessário mover mais 3 cartões de volta para a coluna *To do*, sendo a US 9, US 10 e US 11 (conforme indicam as setas).

As US 3, US 4 e US 5 da coluna *Testing/Code Review* foram marcadas com a cor vermelha para indicar ao time que toda a força de trabalho deve estar concentrada em validar estas histórias para reestabelecer o andamento natural do trabalho.

Por fim, juntamente com o Scrum Master, a equipe entrou em consenso e decidiu manter fora do quadro as novas funcionalidades solicitadas pelo PO.

4 - Perguntas e Decisões para a Daily



É ideal que a Daily Scrum do 6º dia abandone o formato de relatório de status e foque na busca de soluções emergenciais. Algumas decisões e perguntas que devem ser feitas na reunião são:

Decisão: Estabelecer de forma conjunta com o time que nenhum desenvolvedor tem permissão para puxar histórias do To Do até que todas as tarefas que estão ocupando o limite de WIP no quadro sejam realizadas.

Decisão: O *Scrum Master* deverá comunicar oficialmente ao PO a rejeição e a impossibilidade de realização das 2 novas funcionalidades solicitadas por ele.

Pergunta: Alguém da equipe tem o conhecimento técnico necessário para iniciar um *Pair Programming* agora mesmo e retirar as etiquetas vermelhas das 3 tarefas bloqueadas?

Pergunta: O que exatamente causou o gargalo que resultou no acúmulo de 6 tarefas na coluna *Testing* e 7 tarefas na coluna *Doing*?

Pergunta: Quais pessoas da área de desenvolvimento podem suspender a criação de código agora mesmo para atuar exclusivamente como testador e ajudar a finalizar as tarefas acumuladas na coluna de *Testing*?

5 - Plano de recuperação da Sprint




Juntamente com a reorganização do Kanban realizada acima e com a Daily Scrum do 6º dia, o plano de ação para os últimos 4 dias de Sprint deve orientar a equipe para entregar o Produto Mínimo Viável (MVP), seguindo as seguintes diretivas:

Força-Tarefa nos Impedimentos: Como as tarefas bloqueadas na coluna *Testing* estão consumindo o limite de WIP e atrasando a Sprint, a maior parte da equipe fará um *Swarming* (mutirão) focado exclusivamente em validar estes 3 cartões antes de escrever qualquer nova linha de código.

Corte Severo de Escopo: O Product Owner deve assumir perante os stakeholders que a meta de 40 pontos em 10 dias foi um erro de planejamento e que a intenção é abandonar as histórias secundárias e focar exclusivamente nas histórias principais que cumprirão com as principais funcionalidades esperadas para o app.

Pausa no Refinamento Visual : Estabelecer que toda e qualquer tarefa voltada a ajustes de ordem estética como polimento de interface ou animações de transição devem ser imediatamente congeladas. A equipe deve concentrar o esforço técnico para a lógica de negócio, segurança da API e demais critérios indispensáveis para a existência do aplicativo.

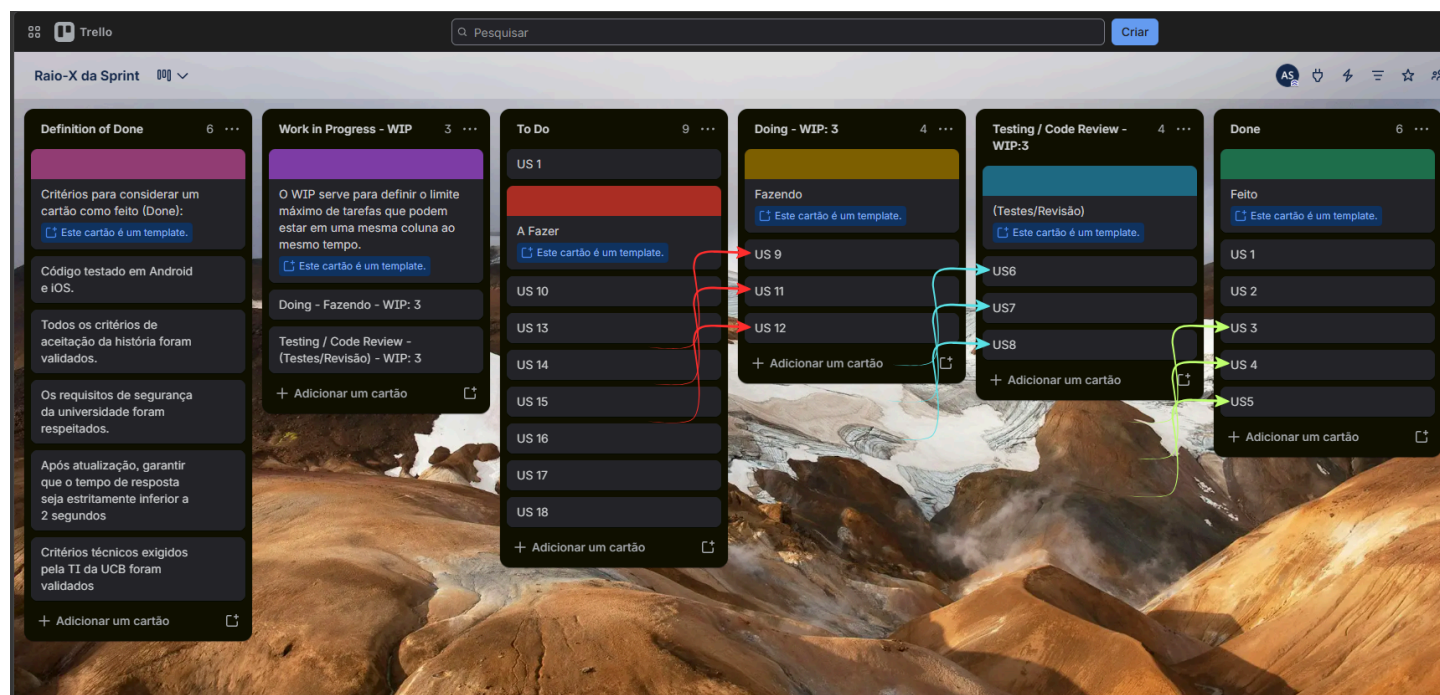

Expectativa da Sprint após os ajustes feitos - Quadro no Trello

Desse modo, espera-se que, após todas as soluções propostas acima, a equipe possa observar o quadro com esta configuração ao final dos 10 dias, garantindo que as funcionalidades principais do app já estejam concluídas e que as funcionalidades subsequentes já estejam em fase de realização e testes.
